

Projektbegriff, Projektarten und PM-Instrumente

P1 + P2 + P3 – WISO Integrative Unternehmensprozesse Personal

Can Siebert

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Donnerstag, 07. Mai 2026

- 1 Einführung in das Projektmanagement
- 2 P2 – Projektbegriff (DIN 69901)
- 3 P3 – Projektarten
- 4 Drei PDL-Projekttypen im Detail
- 5 P1 – PM-Instrumente Überblick
- 6 Stakeholder & Rechtsrahmen
- 7 Zusammenfassung

Warum Projektmanagement in der PDL-Branche?

Beobachtung

Vertrieb, Disposition, Recruiting und Backoffice arbeiten täglich in projektähnlichen Konstellationen.

- Aufbau eines Onsite-Offices bei einem Neukunden
- Recruiting eines kompletten Pflgeteams (Großkundenprojekt)
- Personalumstrukturierung in einer Niederlassung
- Einführung einer neuen Recruiting-Software (Bewerbermanagementsystem)

Lernziel des heutigen Tages

Sie können den Projektbegriff (DIN 69901) sicher anwenden, Projektarten klassifizieren und einen Überblick über die wichtigsten PM-Instrumente geben.

Drei Bausteine des heutigen Tages (P1 + P2 + P3)

P2 – Projektbegriff

DIN 69901, fünf
Projektmerkmale, Abgrenzung
Projekt vs. Routine

P3 – Projektarten

Klassifikation nach Inhalt,
Auftragsherkunft, Größe +
drei PDL-Projekttypen

P1 – PM-Instrumente

Überblick: Planung,
Steuerung, Kommunikation,
Dokumentation; klassisch vs.
agil

Prüfungsrelevant

Der Projektbegriff nach DIN 69901 sowie die Unterscheidung *intern/extern* sind klassische IHK-Prüfungsfragen.

DIN 69901-5

Ein **Projekt** ist ein **Vorhaben**, das im Wesentlichen durch **Einmaligkeit** der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist.

Typische Bedingungen sind:

- Zielvorgabe
- zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben
- projektspezifische Organisation

Quelle: Deutsches Institut für Normung, 2009

Fünf konstitutive Projektmerkmale

- ➊ **Einmaligkeit** der Gesamtbedingungen
- ➋ **Zielvorgabe** – klar, messbar, terminiert
- ➌ **Begrenzungen** – Zeit, Geld, Personal, Sachmittel
- ➍ **Abgrenzung** gegenüber anderen Vorhaben (Tagesgeschäft)
- ➎ **Projektspezifische Organisation** (Projektleitung, Team, Lenkungsausschuss)

Eselsbrücke: „EZ-BAP“

Einmaligkeit, **Z**ielvorgabe, **B**egrenzungen, **A**bgrenzung, **P**rojektorganisation.

Projekt versus Routineaufgabe

Kriterium	Projekt	Routine
Häufigkeit	einmalig, neuartig	wiederkehrend
Ziel	klares Einzelziel	viele Standardziele
Zeitrahmen	befristet	unbefristet
Ressourcen	projektspezifisch	Linienbudget
Organisation	Projektorganisation	Linienorganisation
Risiko	hoch	gering
PDL-Beispiel	Aufbau Onsite-Office	Tägliche Disposition

Wann lohnt sich Projektmanagement?

Drei Kriterien als Entscheidungshilfe:

- ① **Komplexität** – viele Beteiligte, Schnittstellen, Bereiche
- ② **Risiko** – gravierende Folgen bei Misserfolg
- ③ **Innovationsgrad** – keine etablierten Routinen

Faustregel

Wenn mindestens **zwei** Kriterien stark ausgeprägt sind, lohnt sich der Einsatz projektorientierter Methoden.

Beispiel Personaldienstleistungsunternehmen: Disposition vs. Onsite-Aufbau

Disposition (Routine)

- 80 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer auf 4 Stammkunden
- Täglich, eingespielt
- Standardprozess
- Linienorganisation Disponentin

Onsite-Office (Projekt)

- 200 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer, neuer Kunde
- Eigener Container, IT, Personal
- 18-Monats-Rahmenvertrag
- Projektleitung + Team

Erkenntnis

Selbst innerhalb derselben Niederlassung können Routine und Projekt parallel laufen.

Drei Klassifikationsdimensionen

1. Inhaltlich-funktional

Investitions-, Organisations-, Forschungs-, IT-, Personalprojekte

2. Auftragsherkunft

Interne (eigene Organisation) vs. externe (Kundenauftrag) Projekte

3. Größe und Komplexität

Klein- (< 50 PT) – Mittel- (50–500 PT) – Großprojekte (> 500 PT)

Klassifikation nach Inhalt

Investitionsprojekt

Aufbau einer Niederlassung, Kauf eines Bewerbermanagementsystem

F&E-Projekt

KI-Matching-Plattform (selten in Personaldienstleistungsunternehmen)

Organisationsprojekt

Personalumstrukturierung, Onsite-Konzept

Personalprojekt


Onsite-Management, Großkundenprojekt, Outplacement

IT-Projekt

ATS-Migration, App-Einführung

Mind-Map: Projektarten in der PDL-Branche

Projektarten in der Personaldienstleistung

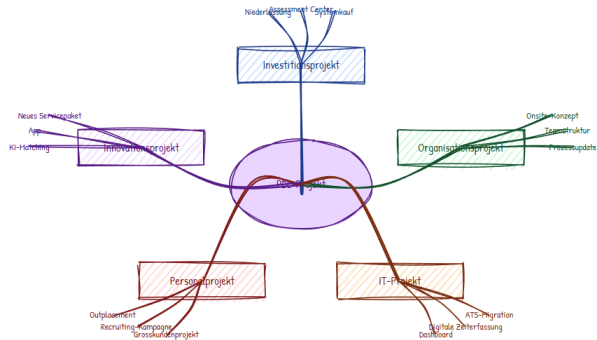

Interne vs. externe Projekte

Interne Projekte

- Auftraggeber + AN gleiche Organisation
- Beispiel: neues Schichtplan-Tool
- Beispiel: Überarbeitung Onboarding für Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- Steuerung: Niederlassungsleitung

Externe Projekte

- Auftraggeber: externer Kunde
- Beispiel: Onsite-Management
- Beispiel: Pflegekräfte-Recruiting
- Vertrag, SLA, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz/Werkvertrag

Achtung Scheinwerkvertrag

Externe PDL-Projekte müssen sauber abgrenzen: Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) oder Werk-/Dienstvertrag.

Kategorie	PT	Budget	PDL-Beispiel
Klein	< 50	< 25k €	Onboarding-Workshop
Mittel	50–500	25–250k €	Aufbau Onsite-Office
Groß	> 500	> 250k €	Konzern-Personalumstrukturierung

Hinweis

Auch Großkundenprojekte mit 60+ Stellen zählen meist als Großprojekt.

Kerngedanke

PDL-Personal sitzt direkt beim Kunden vor Ort und steuert alle ZAN-Themen.

Phasen:

- ① Akquise und Vertragsverhandlung (mit SLA)
- ② Konzeption (Personalbedarf, Schnittstellen)
- ③ Aufbau (Büro, IT, Recruiting Onsite-Manager:in)
- ④ Pilotbetrieb
- ⑤ Regelbetrieb mit Reporting
- ⑥ Vertragsende oder Verlängerung

Risiken

Konflikt mit Niederlassung, AÜG-Konformität (18 Monate, Equal Pay nach 9 Monaten), Mitarbeiterabwerbung durch Kunden.

Definition

Recruiting-Projekt mit hohem Volumen für einen Schlüsselkunden, oft zeitlich konzentriert.

Beispiel: Klinikum-Eröffnung

- Ziel: 60 examinierte Pflegekräfte bis 30.09.2026
- Budget: 280.000 €
- Team: 4 Recruiter:innen + 1 PL + 1 Backoffice
- Methodik: Active Sourcing (XING, LinkedIn), Headhunting EU-Ausland, Pflegemessen

Erfolgsfaktoren

Standardisierte Pipelines, schnelle Rückmeldezyklen, klare Eskalationswege.

Beispiel: Trennung Vertrieb / Recruiting in Niederlassung Hannover

- 8 Allrounder → 4 Vertrieb + 4 Recruiting
- Ziel: Spezialisierung, höhere Effizienz
- Frist: 31.07.2026

Methoden:

- Mitarbeitergespräche (Kompetenzen, Präferenzen)
- Anreizsysteme (KPIs je Funktion)
- Schulungen und Coachings
- Office-Umzug, neues Sitzkonzept

Risiken

Widerstand der Mitarbeitenden, Verlust von Allrounder-Kompetenz, Kündigungen.

Vier Werkzeuggruppen

Planung

Lasten/Pflichtenheft, SMART-Ziele, Projektstrukturplan, Gantt, Netzplan, Stakeholderanalyse

Steuerung

Soll-Ist, EVA, MTA, KPI-Dashboards, Risikoregister

Kommunikation

Steckbrief, Kick-off, Status-Reports, Lenkungsausschuss

Dokumentation

Projekthandbuch, Protokolle, Lessons Learned, Abschlussbericht

Welches Instrument wann?

Instrument	Klein	Mittel	Groß
Projektsteckbrief	X	X	X
SMART-Ziele	X	X	X
Stakeholderanalyse	–	X	X
Lasten-/Pflichtenheft	–	X	X
Projektstrukturplan	–	X	X
Gantt-Diagramm	X	X	X
Netzplan	–	–	X
Risikoregister	–	X	X
Lenkungsausschuss	–	–	X
Lessons Learned	X	X	X

Klassisch – Agil – Hybrid

Klassisch

Wasserfall, V-Modell, PRINCE2; viel Vorabplanung, Dokumentation

Agil

Scrum, Kanban; iterative Sprints, Feedback, wenig Dokumentation

Hybrid

Klassische Rahmenplanung + agile Umsetzungsphasen

PDL-Praxis

Vertrag und Meilensteine klassisch, Recruiting-Pipelines agil (z. B. wochenweise Sprints, Daily Stand-up im Team).

Stakeholder eines PDL-Projekts

- Kundenbetrieb: Einkauf, HR, Fachabteilung
- Bewerber:innen / Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer
- Niederlassungsleitung
- Disposition, Recruiting, Vertrieb, Backoffice
- Betriebsrat im Kundenbetrieb (§ 99 BetrVG)
- Gesamtverband der Personaldienstleister als Branchenverband
- Bundesagentur für Arbeit (Erlaubnisbehörde)

Vertiefung

Power-Interest-Matrix und Stakeholder-Map: Tag 06.

Drei-Personen-Verhältnis (PDL)



Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – wichtigste Eckdaten

- 18 Monate Höchstüberlassung pro ZAN-Person bei demselben Kunden
- Equal Pay spätestens nach 9 Monaten
- Erlaubnispflicht (Bundesagentur für Arbeit)
- Kennzeichnungspflicht (kein verdeckter Verleih)

TV-GVP

Manteltarifvertrag, Entgelttarifvertrag, Branchenzuschläge. **Gesamtverband der Personaldienstleister seit 01.01.2022 – Fusion aus iGZ und BAP.**

Bundesministerium der Justiz, 2017; Gesamtverband der Personaldienstleister e.V., 2022

- Projekt nach DIN 69901: Einmaligkeit, Ziel, Begrenzungen, Abgrenzung, Organisation
- Klassifikation nach Inhalt, Auftragsherkunft, Größe
- Drei PDL-Projekttypen: Onsite-Management, Großkundenprojekt, Personalumstrukturierung
- PM-Instrumente: Planung, Steuerung, Kommunikation, Dokumentation
- Klassisch / Agil / Hybrid – in Personaldienstleistungsunternehmen meist hybrid
- Rechtsrahmen: Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (18 Mo, 9 Mo Equal Pay), TV-GVP (seit 01.01.2022)

Nächster Tag (Fr 08.05.): P4

Lastenheft / Pflichtenheft (DIN 69905), Auftragsklärung und Anforderungsprofil bei PDL-Recruitingaufträgen.

Vorbereitung (freiwillig)

Notieren Sie ein konkretes externes Recruiting-Projekt aus Ihrer Praxis (oder fiktiv): Welche **Anforderungen** hätte der Kunde? Welche **Leistungen** könnten Sie anbieten?

- Bundesministerium der Justiz. (2017). Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) [Letzte Änderung 2017: 18 Monate Höchstüberlassung, Equal Pay nach 9 Monaten].
- Deutsches Institut für Normung. (2009). DIN 69901: Projektmanagement – Projektmanagementsysteme [Teile 1–5: Grundlagen, Prozesse, Methoden, Daten und Begriffe].
- Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (2022). GVP – Gesamtverband der Personaldienstleister: Leitlinien und Tarifverträge [Fusion aus iGZ und BAP zum 01.01.2022]. <https://www.personaldienstleister.de>
