

# Projektrollen, Team & Projektorganisation

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer –  
Personaldienstleistungskaufmann/-frau – Tag 07

Can Siebert

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

12. Mai 2026 – Stand 05/2026

- 1 Lernziele & Einstieg
- 2 Projektrollen
- 3 PDL-Praxis: Großkundenprojekt
- 4 Projektorganisationsformen
- 5 Auswahl der passenden Organisationsform
- 6 Teamphasen & Konflikte
- 7 Zusammenfassung & Ausblick

## Sie können nach diesem Tag...

- die vier zentralen **Projektrollen** benennen und unterscheiden,
- Rollen auf das PDL-Beispiel *Großkundenrecruiting* übertragen,
- vier Formen der **Projektorganisation** erklären,
- die passende Organisationsform anhand von Projektmerkmalen wählen.

## Lerninhalte aus dem Rahmenlehrplan

P8: Projektrollen / Projektteam    |    P9: Projektorganisation

# Warum Rollen & Organisation?

- Projekt = einmaliges Vorhaben mit klaren Zielen (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009)
- Erfolg hängt ab von:
  - klaren **Verantwortlichkeiten**
  - klar geregelter **Zusammenarbeit** mit der Linie
- PDL-Branche: Großkundenrecruiting, Onsite, Niederlassungseröffnung – Disposition, Recruiting und Vertrieb müssen koordiniert agieren (Kuster et al., 2022)

# Vier zentrale Projektrollen

## Projektleitung (PL)

Operative Verantwortung  
(Zeit, Kosten, Qualität)

## Lenkungsausschuss

Strategische Aufsicht,  
Phasen-Reviews

## Teammitglied

Bearbeitet Arbeitspakete  
Berichtet an PL

## Sponsor

Gesamtverantwortung,  
Budget, Rückendeckung

- Planung: Strukturplan, Ablaufplan, Ressourcenplan
- Steuerung: Aufgabenverteilung, Motivation
- Reporting: Statusberichte, Eskalationen
- Überwachung: Soll-Ist-Vergleich, KPIs
- Risiko- und Konfliktmanagement
- Dokumentation, Abschlussbericht

## Magisches Dreieck

Zeit – Kosten – Qualität (Leistung): *drei Größen, die immer in Spannung stehen*

## Aufgaben

- Bearbeitung der zugewiesenen Arbeitspakete
- Statusmeldungen an die Projektleitung
- Mitwirkung an Planung und Qualitätssicherung

## Konfliktpotenzial

- **Fachlich:** Berichtet an die Projektleitung
- **Disziplinarisch:** Berichtet an die Linienführung
- Loyalitätskonflikte sind vorprogrammiert – Lösung: RACI-Matrix & Spielregeln

## Zusammensetzung

Geschäftsleitung + Auftraggeber + Vertreter wichtiger Stakeholder

## Aufgaben

- Initiierung: Projektauftrag, Budget freigeben
- Phasen-Reviews: Meilensteine prüfen, Phasen freigeben
- Eskalation: Zielanpassungen, Budgetnachforderungen
- Abschluss: formal genehmigen, Lessons Learned

## Tagungsfrequenz

Alle 4–8 Wochen, an Meilensteinen – nicht im operativen Wochenrhythmus



## Wer ist das?

Einzelperson mit Gesamtverantwortung für den Projekterfolg aus Unternehmenssicht

## Aufgaben

- Budget bereitstellen
- Strategische Zielvorgabe (Business Case)
- Politische Rückendeckung der PL
- Repräsentation gegenüber externen Stakeholdern

## Sponsor vs. Lenkungsausschuss

Sponsor = **Person** mit Gesamtverantwortung

Lenkungsausschuss = **Gremium** mit strategischer Aufsicht

# Vergleichstabelle: Rollen

| Rolle                    | Verantwortung            | Hauptaufgaben          | Berichtsrichtung  |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>PL</b>                | Operative Zielerreichung | Planung, Steuerung     | Lenkungsausschuss |
| <b>Teammitglied</b>      | Arbeitspaket-Erledigung  | Fachliche Umsetzung    | PL + Linie        |
| <b>Lenkungsausschuss</b> | Strategische Aufsicht    | Reviews, Genehmigungen | Geschäftsleitung  |
| <b>Sponsor</b>           | Gesamtverantwortung      | Budget, Rückendeckung  | Eigentümer        |

# Praxisbeispiel: “Recruiting 50 Lageristen”

## Projekt-Setup

Großkunde Logistik, 50 Lageristen, Mehrschicht, 6 Wochen Vorlauf, AÜG/Zeitarbeit

## Rollenverteilung

- **Sponsor:** Geschäftsführer:in Personaldienstleistungsunternehmen
- **Lenkungsausschuss:** GF + Vertriebsleitung + Operations
- **Projektleitung:** Niederlassungsleiter:in
- **Team:** 2–3 Recruiter:innen + 1–2 Disponent:innen + 1 Vertriebsmitarbeiter:in

## Typische Reibungspunkte


- Wer übernimmt das **Bewerber-Onboarding**? (Recruiting / Disposition?)
- Wer schreibt den **Arbeitnehmerüberlassungsvertrag**? (Vertrieb / NL?)
- Wer ist Ansprechpartner:in für die Mitarbeitenden im Einsatz? (Disposition / Onsite?)

## Lösung: RACI-Matrix

Responsible – Accountable – Consulted – Informed:  
klare Verantwortungs-Zuordnung pro Aktivität

# Organigramm Projekt Personaldienstleistungsunternehmen (Beispiel)

## Projektorganisation im Personaldienstleister

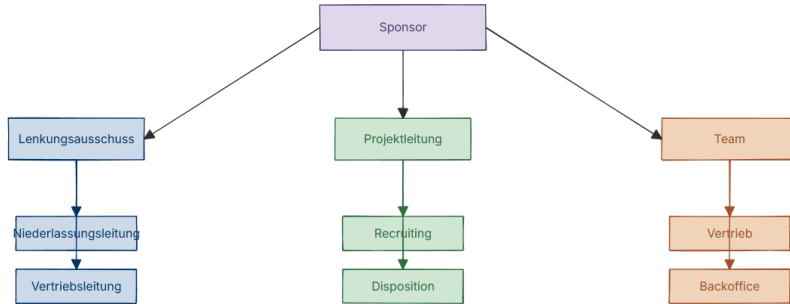

## Equal Pay nach 9 Monaten (§ 8 AÜG)

Nach 9 Monaten Einsatz beim selben Kundenbetrieb müssen Zeitarbeitnehmer:innen den **gleichen Lohn** wie die Stammbesellschaft erhalten (Bundesministerium der Justiz, 2017).

## Projektrelevanz

- Bei Kalkulation der Projektkosten einrechnen
- Bei Schichtplanung beachten (Rotation gegen Überlassungshöchstdauer)
- Bei Vertragsverhandlung mit Kunden transparent machen

# Vier Organisationsformen im Überblick

## Kontinuum: Macht der Projektleitung

- 1 **Reine Linienorganisation** (Linien-PM) – Macht PL: sehr gering
- 2 **Stab-Linien-Organisation** (Stab-PM) – Macht PL: gering
- 3 **Matrix-Organisation** (Matrix-PM) – Macht PL: mittel
- 4 **Reine Projektorganisation** – Macht PL: hoch

## Vergleich grafisch

Vier Organisationsformen im Ueberblick



# Form 1: Reine Linienorganisation (Linien-PM)

## Merkmal

Projekt wird in der Linie abgewickelt – keine eigene PL mit Weisungsbefugnis

## Vorteile

- Keine Strukturänderung
- Hohe Flexibilität
- Niedriger Koordinationsaufwand

## Nachteile

- Tagesgeschäft dominiert
- Keine ganzheitliche Verantwortung
- Schwierige Erfolgskontrolle



## Form 2: Stab-Linien-Organisation (Stab-PM)

### Merkmal

Stabsstelle “Projektkoordination” bei Geschäftsleitung – nur **Beratung**, keine **Weisung**

### Vorteile

- Zentrale Koordination
- Wissensaufbau im Stab
- Niedrige Personalkosten

### Nachteile

- Keine Durchsetzungsmacht
- Abhängig von Linie
- Konflikte bei Ressourcen

# Form 3: Matrix-Organisation (Matrix-PM)

## Merkmal

Doppelte Weisungsstruktur: **fachlich** an PL, **disziplinarisch** an Linie

## Vorteile

- Hohe Flexibilität
- Effiziente Ressourcennutzung
- Wissenstransfer in Linie

## Nachteile

- Loyalitätskonflikte
- Hoher Koordinationsaufwand
- Spielregeln nötig

## Verbreitung

Häufigste Form in der Praxis – typisch für PDL-Großkundenprojekte

## Form 4: Reine Projektorganisation (autonome PO)

### Merkmal

Mitarbeitende werden **vollständig aus der Linie herausgelöst** – volle Macht bei PL

### Vorteile

- Klare Verantwortung
- Hohe Identifikation
- Schnelle Entscheidungen

### Nachteile

- Hoher administrativer Aufwand
- Reintegration schwierig
- Wissensverlust für Linie

### Beispiel

Eröffnung neuer Niederlassung Hamburg – 12 Monate Task Force

# Vergleichstabelle Organisationsformen

| Form             | Macht der PL       | Geeignet für                      |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Linien-PM</b> | sehr gering        | kleine, kurze Projekte            |
| <b>Stab-PM</b>   | gering (Beratung)  | mittlere Beratungsprojekte        |
| <b>Matrix-PM</b> | mittel (geteilt)   | PDL-Großkundenprojekte            |
| <b>Reine PO</b>  | hoch (vollständig) | sehr große, strategische Projekte |

# Sechs Auswahlkriterien (Patzak/Rattay)

- ① Projektgröße (Personentage, Budget)
- ② Projektdauer
- ③ Strategische Bedeutung
- ④ Komplexität / Innovationsgrad
- ⑤ Personalbindung ( % der Arbeitszeit)
- ⑥ Anzahl Parallelprojekte

(Patzak & Rattay, 2014)

## Vier Beispiele

- Bewerbungsbogen einführen (1 Wo, 1 Pers.) → **Linien-PM**
- Recruiting-Prozess optimieren (4 Mo, 3 á 30 %) → **Stab/Matrix-PM**
- 50 Lageristen Großkunde (6 Wo, 5 á 50 %) → **Matrix-PM**
- Eröffnung NL Hamburg (12 Mo, 10 á 100 %) → **Reine PO**

# Tuckman-Phasen (1965)

- ➊ **Forming** – Orientierung, vorsichtige Annäherung
- ➋ **Storming** – Konflikt, Machtkämpfe
- ➌ **Norming** – Regelbildung, Vertrauen wächst
- ➍ **Performing** – Leistung, autonomes Arbeiten
- ➎ **Adjourning** – Abschluss, Reintegration

## PDL-Relevanz

Recruiting-Teams für 4–6 Wochen-Projekte erreichen oft nur Storming oder Norming – aktive Moderation durch NL essenziell!

## Drei typische Arten

- **Sachkonflikt:** unterschiedliche Meinungen zur Lösung
- **Beziehungskonflikt:** persönliche Antipathien
- **Rollenkonflikt:** unklare Verantwortung (Matrix!)

## Werkzeuge zur Prävention

- RACI-Matrix
- Kick-off-Workshop
- Wöchentlicher Jour fixe
- Klar definierter Eskalationspfad



## 5 Kernbotschaften

- ❶ Vier Rollen: PL, Team, Lenkungsausschuss, Sponsor
- ❷ Vier Organisationsformen: Linien-, Stab-, Matrix-, reine PO
- ❸ Matrix-PM ist Standard in PDL-Großkundenprojekten
- ❹ Tuckman erklärt Teamverhalten – aktiv führen!
- ❺ Konfliktprävention durch RACI, Kick-off, Eskalationspfad

## Morgen: Projektstrukturplan

- Wie zerlegt man ein Projekt in handhabbare Arbeitspakete?
- WBS-Hierarchie (Work Breakdown Structure)
- Praxis: Projektstrukturplan für "Recruiting 50 Lageristen Großkunde"

- Bundesministerium der Justiz. (2017). Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) [Neufassung 2017; zuletzt geändert 2024].
- DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901 – Projektmanagement – Projektmanagementsysteme*. Beuth Verlag. Berlin.
- Kuster, J., Bachmann, C., Hubmann, M., Lippmann, R., & Schneider, P. (2022). *Handbuch Projektmanagement: Agil – Klassisch – Hybrid* (5. Aufl.). Springer Gabler.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement: Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen* (6. Aufl.). Linde Verlag.

# Vielen Dank!

Fragen & Diskussion

© 2026 Can Siebert
