
Projektstrukturplan (Projektstrukturplan)

Tag 08 – Personaldienstleistungskaufmann/-frau

Block 3: Projektmanagement – Lerninhalt P10

Can Siebert

13. Mai 2026 – Stand 05/2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung: Warum ein Projektstrukturplan?	4
2	Begriff und Funktion des Projektstrukturplan	4
2.1	Definition nach DIN 69901-2	4
2.2	Funktionen des Projektstrukturplan im Projektmanagement	5
3	Aufbau und Hierarchie eines Projektstrukturplan	5
3.1	Wie tief soll man gliedern?	6
4	Drei Gliederungsprinzipien	6
4.1	Objektorientierter Projektstrukturplan	6
4.2	Funktionsorientierter Projektstrukturplan	7
4.3	Gemischter Projektstrukturplan (Phasen + Objekte)	7
5	Arbeitspakete (AP) – Das Herzstück des Projektstrukturplan	7
5.1	Definition Arbeitspaket nach DIN 69901-5	8
5.2	Bestandteile einer Arbeitspaketbeschreibung (AP-Karte / Steckbrief) . . .	8
5.3	Beispiel AP-Karte: “Active Sourcing Lageristen”	9
5.4	Typische Fehler bei der AP-Definition	9
6	Schritte zur PSP-Erstellung	9
6.1	Methodischer Vorgehensplan (Top-Down)	9
6.2	Alternative: Bottom-Up-Verfahren	10
6.3	Mischverfahren (Top-Down + Bottom-Up)	10
7	PDL-Praxisbeispiel: Projektstrukturplan “Recruiting 50 Lageristen GroSS-	
	kunde”	10
7.1	Ebene 1: Hauptphasen	10
7.2	Ebene 2 + 3: Detaillierte Struktur	10
7.3	Visuelle Darstellung	12
7.4	Plausibilitätscheck	12
8	Vom Projektstrukturplan zum Ablaufplan und Kostenplan	13
9	Software-Werkzeuge zur PSP-Erstellung	13
10	Glossar	13
11	Übungsaufgaben	15

12 Zusammenfassung

15

1 Einführung: Warum ein Projektstrukturplan?

Der Projektstrukturplan (Projektstrukturplan, engl. *Work Breakdown Structure, WBS*) ist nach DIN 69901-2 die “vollständige hierarchische Darstellung aller Elemente eines Projekts” (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009). Er ist das zentrale Planungsinstrument im Projektmanagement und bildet die Grundlage für alle weiteren Planungsschritte: Ablaufplan, Ressourcenplan, Kostenplan, Risikoanalyse und Reporting.

Ein gutes PM-Sprichwort lautet: “*Was nicht im Projektstrukturplan steht, wird im Projekt nicht gemacht.*” Das Erstellen des Projektstrukturplan zwingt das Projektteam, alle Aufgaben systematisch zu durchdenken und in handhabbare Einheiten – die **Arbeitspakete** – zu zerlegen.

In der Personaldienstleistungsbranche kommt der Projektstrukturplan besonders bei GroSSkundenprojekten zum Einsatz, etwa bei der Akquise und Besetzung von 50 oder 100 Stellen innerhalb eines kurzen Zeitfensters. Heute erstellen wir gemeinsam einen Projektstrukturplan für das laufende Beispielprojekt “Recruiting 50 Lageristen GroSSkunde”.

Lernziele Tag 08

- Sie können den Begriff **Projektstrukturplan** und seine Funktion im PM erläutern.
- Sie kennen die drei Gliederungsprinzipien (**objektorientiert, funktionsorientiert, gemischt**).
- Sie können einen Projektstrukturplan in mehreren Ebenen aufbauen und einzelne **Arbeitspakete (AP)** definieren.
- Sie kennen die Bestandteile einer Arbeitspaketbeschreibung (AP-Karte / Steckbrief).
- Sie können einen Projektstrukturplan für ein PDL-GroSSkundenprojekt eigenständig entwerfen.

2 Begriff und Funktion des Projektstrukturplan

2.1 Definition nach DIN 69901-2

DIN 69901-2 – Projektstrukturplan

“Vollständige hierarchische Darstellung aller Elemente (Teilprojekte, Teilaufgaben, Arbeitspakete) eines Projekts in Strukturform mit ihren projektspezifischen Beziehungen.”

Wesentliche Merkmale eines Projektstrukturplan sind:

- **Vollständigkeit** – alle Aufgaben sind erfasst (100- %-Regel)
- **Eindeutigkeit** – jede Aufgabe ist nur einmal enthalten (Überschneidungsfreiheit)
- **Hierarchie** – Gliederung in mehreren Ebenen (Top-down)
- **Projektbezug** – nur projektrelevante, keine Tagesgeschäftsaufgaben

2.2 Funktionen des Projektstrukturplan im Projektmanagement

Der Projektstrukturplan erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig:

1. **Strukturierung** – Zerlegung des Projekts in handhabbare Einheiten
2. **Verantwortungszuordnung** – jedes AP hat genau eine/n AP-Verantwortliche/n
3. **Aufwandsschätzung** – jedes AP wird mit Zeit und Kosten bewertet
4. **Ablaufplanung** – AP werden später in Vorgängen sequenziert (Tag 09)
5. **Reporting-Basis** – Soll-Ist-Vergleiche je AP ermöglichen Steuerung
6. **Kommunikationswerkzeug** – gemeinsames Bild für alle Stakeholder

Was der Projektstrukturplan NICHT ist

Der Projektstrukturplan enthält **keine zeitliche Reihenfolge** (das macht später der Ablaufplan / Gantt) und **keine Termine**. Er beantwortet nur die Frage: *Was muss im Projekt gemacht werden?*

3 Aufbau und Hierarchie eines Projektstrukturplan

Ein Projektstrukturplan ist hierarchisch aufgebaut. Die **Wurzel** (Ebene 0) ist das Projekt selbst. Darunter folgen Teilprojekte (Ebene 1), Teilaufgaben (Ebene 2) und schließlich die Arbeitspakete (Ebene 3 oder tiefer). Jede Ebene wird hierarchisch nummeriert (typisch: 1, 1.1, 1.1.1).

Ebene	Bezeichnung	Beispielnummer
0	Gesamtprojekt	0
1	Teilprojekt / Hauptphase	1, 2, 3
2	Teilaufgabe / Modul	1.1, 1.2, 2.1
3	Arbeitspaket (AP)	1.1.1, 1.1.2
4	Tätigkeit / Subtask (optional)	1.1.1.1

3.1 Wie tief soll man gliedern?

Eine sinnvolle Gliederungstiefe liegt bei drei bis fünf Ebenen. Faustregeln aus der Praxis (Burghardt, 2018; Kuster et al., 2022):

- **8/80-Regel:** Ein AP sollte zwischen 8 Stunden (1 Tag) und 80 Stunden (2 Wochen) Aufwand haben.
- **Reporting-Periode-Regel:** Ein AP sollte nicht länger dauern als zwei Reporting-Perioden (z. B. 2 Wochen bei wöchentlichem Reporting).
- **Ein-Verantwortlicher-Regel:** Genau eine Person ist für ein AP verantwortlich.
- **Liefer-Ergebnis-Regel:** Jedes AP produziert ein klar definiertes Liefer-Ergebnis (Deliverable).

Die Summe aller untergeordneten Elemente einer Ebene muss **100 %** der übergeordneten Aufgabe abdecken. Beispiel: Wenn das Teilprojekt 1 “Akquise” aus den Teilaufgaben 1.1 “Active Sourcing”, 1.2 “Stellenanzeigen” und 1.3 “Empfehlungen” besteht, müssen diese drei zusammen 100 % der Akquise abdecken.

4 Drei Gliederungsprinzipien

Bei der Erstellung eines Projektstrukturplan kann man nach drei verschiedenen Prinzipien gliedern. Welches Prinzip am besten passt, hängt vom Projekttyp ab (Patzak & Rattay, 2014).

4.1 Objektorientierter Projektstrukturplan

Die Gliederung folgt den **Liefergegenständen** (Produkten, Komponenten, Modulen) des Projekts. Jedes Teilprojekt ist ein Objekt.

Beispiel “Hausbau”: 1. Keller, 2. Erdgeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Dach.

PDL-Beispiel “Recruiting 50 Lageristen”: 1. Schicht 1 (Frühschicht 25 Personen),
2. Schicht 2 (Spätschicht 25 Personen). *Wenig sinnvoll, da Schichten meist gleichzeitig besetzt werden.*

Geeignet für: Bauprojekte, Produktentwicklung, Software-Module.

4.2 Funktionsorientierter Projektstrukturplan

Die Gliederung folgt den **Funktionen / Tätigkeitsarten** des Projekts. Jedes Teilprojekt ist eine Funktion.

Beispiel “Hausbau”: 1. Planung, 2. Genehmigung, 3. Rohbau, 4. Innenausbau, 5. Übergabe.

PDL-Beispiel “Recruiting 50 Lageristen”: 1. Akquise, 2. Auswahl, 3. Einstellung, 4. Onboarding, 5. Einsatzsteuerung. *Sinnvoll, da Recruiting-Projekte typische Funktionen haben.*

Geeignet für: Recruiting-Projekte, Veranstaltungsplanung, Beratungsprojekte.

4.3 Gemischter Projektstrukturplan (Phasen + Objekte)

Mischung beider Prinzipien – eine Ebene nach Phasen, andere nach Objekten.

Beispiel “Hausbau”: Ebene 1 nach Phasen (Planung, Bau, Übergabe), Ebene 2 nach Objekten (Wand, Dach, Fenster).

PDL-Beispiel “Recruiting 50 Lageristen”: Ebene 1 nach Funktionen (Akquise, Auswahl, Einstellung, Onboarding, Steuerung), Ebene 2 teilweise nach Quellen (Active Sourcing, Stellenbörsen, Empfehlungen). *Praktisch oft die beste Lösung.*

Prinzip	Vorteile	Nachteile
Objektorientiert	Klare Liefergegenstände, einfaches Reporting je Objekt	Funktionen verteilen sich über mehrere Objekte (Doppelarbeit)
Funktionsorientiert	Klare Aufgabenzuordnung an Fachbereiche, Standardisierbar	Liefergegenstände werden erst spät sichtbar
Gemischt	Flexibel, praxisnah, kombiniert Stärken	Komplexer, anspruchsvoller in der Erstellung

5 Arbeitspakete (AP) – Das Herzstück des Projektstrukturplan

Das Arbeitspaket (AP) ist die kleinste eigenständige Planungseinheit im Projektstrukturplan. Es ist das Element, das tatsächlich *ausgeführt* und *gemessen* wird.

5.1 Definition Arbeitspaket nach DIN 69901-5

DIN 69901-5 – Arbeitspaket

“In sich geschlossene Aufgabenstellung innerhalb eines Projekts, die bis zu einem festgelegten Zeitpunkt mit definiertem Ergebnis und Aufwand vollbracht werden kann.”

5.2 Bestandteile einer Arbeitspaketbeschreibung (AP-Karte / Steckbrief)

In der Praxis wird jedes AP in einer **AP-Karte** (auch: AP-Steckbrief, Work Package Description) dokumentiert. Folgende Inhalte sind Standard (Schelle et al., 2018):

Feld	Beschreibung
AP-Nummer	Hierarchische Codierung (z. B. 2.3.1)
AP-Bezeichnung	Kurzer, eindeutiger Titel
AP-Verantwortliche/r	Genau eine Person
Beschreibung	Was ist konkret zu tun?
Liefer-Ergebnis (Deliverable)	Was wird am Ende abgegeben?
Voraussetzungen / Inputs	Was muss vorher fertig sein?
Aufwand (PT / Stunden)	Geschätzter Personenaufwand
Kosten ()	Geschätzte Kosten
Start-/Endtermin (geplant)	Wann beginnt/endet das AP?
Abnahmekriterien	Wann gilt das AP als “fertig”?
Risiken	Bekannte Risiken / Annahmen

5.3 Beispiel AP-Karte: “Active Sourcing Lageristen”

AP-Karte “Active Sourcing Lageristen”

- **AP-Nr.:** 1.1
- **Bezeichnung:** Active Sourcing über LinkedIn / XING / Indeed
- **Verantwortlich:** Recruiter:in A (Frau Müller)
- **Beschreibung:** Identifikation und Direktansprache von 200 potenziellen Lageristen über soziale Netzwerke und Bewerberportale
- **Liefer-Ergebnis:** 30 qualifizierte Bewerber:innen im Bewerbermanagementsystem
- **Voraussetzungen:** Anforderungsprofil aus Tag 06 freigegeben
- **Aufwand:** 40 PT (8 Personentage Vollzeit, verteilt auf 2 Recruiter:innen á 50 %)
- **Kosten:** 6.400 (Personal) + 1.200 (Account-Kosten Premium)
- **Termin:** KW 20–22
- **Abnahmekriterien:** Mind. 30 Bewerber:innen im Bewerbermanagementsystem, 15 davon mit vollständigen Unterlagen
- **Risiken:** Konkurrenz durch andere Personaldienstleistungsunternehmen; geringere Resonanz im Sommerurlaub

5.4 Typische Fehler bei der AP-Definition

- **Zu groSS / zu klein:** APs sollten 8–80 Stunden Aufwand haben.
- **Mehrere Verantwortliche:** Genau eine Person ist verantwortlich (bei Bedarf mit “Beteiligten”).
- **Unklares Ergebnis:** “Recruiting machen” ist kein Ergebnis. “30 Bewerber:innen im Bewerbermanagementsystem” ist eines.
- **Nicht messbar:** Abnahmekriterien fehlen → kein klarer Abschluss möglich.
- **Tagesgeschäft im Projektstrukturplan:** “E-Mails beantworten” gehört nicht ins Projekt.

6 Schritte zur PSP-Erstellung

6.1 Methodischer Vorgehensplan (Top-Down)

1. **Projektziel klären** – Was ist das Projektergebnis? (aus Tag 06: SMART-Ziele)
2. **Hauptphasen oder Hauptliefergegenstände identifizieren** (Ebene 1)
3. **Teilaufgaben pro Hauptphase ableiten** (Ebene 2)

4. **Arbeitspakete definieren** (Ebene 3)
5. **Vollständigkeit prüfen** (100- %-Regel)
6. **Verantwortliche zuordnen** (1 Person pro AP)
7. **AP-Karten ausarbeiten** (Steckbrief je AP)
8. **Mit Team und Lenkungsausschuss abstimmen**

6.2 Alternative: Bottom-Up-Verfahren

Beim Bottom-Up sammelt das Team zuerst alle denkbaren Aufgaben (z. B. mit Brainstorming auf Karten / Post-its) und gruppiert sie anschließend zu Teilaufgaben und Hauptphasen. Vorteil: alle Erfahrungen des Teams flieSSen ein. Nachteil: Gefahr von Lücken und Überschneidungen.

6.3 Mischverfahren (Top-Down + Bottom-Up)

In der Praxis kombiniert man beide: Die PL gibt eine erste Struktur Top-Down vor, das Team ergänzt fehlende Aufgaben Bottom-Up im Workshop.

7 PDL-Praxisbeispiel: Projektstrukturplan “Recruiting 50 Lageristen GroSSkunde”

Wir entwickeln einen funktionsorientierten Projektstrukturplan für unser Beispielprojekt.

7.1 Ebene 1: Hauptphasen

1. Akquise / Bewerbergewinnung
2. Auswahl / Eignungsprüfung
3. Einstellung / Vertragsmanagement
4. Onboarding / Einsatzvorbereitung
5. Einsatzsteuerung / Onsite-Betrieb

7.2 Ebene 2 + 3: Detaillierte Struktur

1. Akquise

- 1.1 Active Sourcing (LinkedIn, XING, Indeed)

- 1.2 Stellenanzeigen (Stepstone, Indeed, eigene Website)
- 1.3 Empfehlungsprogramm intern + extern
- 1.4 Kooperation Bundesagentur für Arbeit

2. Auswahl

- 2.1 Telefon-Screening (Erstkontakt)
- 2.2 Vorstellungsgespräche vor Ort
- 2.3 Eignungstests (Logistik-spezifische Tests)
- 2.4 Referenzprüfungen
- 2.5 Entscheidung in Kandidaten-Konferenz

3. Einstellung

- 3.1 Vertragserstellung (Arbeitsvertrag Personaldienstleistungsunternehmen nach TV-GVP)
- 3.2 Personalakte anlegen (DSGVO-konform)
- 3.3 Anmeldung Sozialversicherung / Krankenkasse
- 3.4 Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit Kundenbetrieb (gem. AÜG)


4. Onboarding

- 4.1 Sicherheitsunterweisung (gem. ArbSchG, DGUV)
- 4.2 Ausgabe Arbeitskleidung / PSA
- 4.3 Einweisung am Einsatzort beim Kunden
- 4.4 Erstellung Schichtplan Wochen 1–4

5. Einsatzsteuerung

- 5.1 Tägliche Disposition (Krankmeldungen, Schichtwechsel)
- 5.2 Wöchentliches Statusmeeting mit Kundenbetrieb
- 5.3 Stunden-Erfassung und Lohnabrechnung
- 5.4 Mitarbeiter-Feedbackgespräche nach 4 Wochen

7.3 Visuelle Darstellung

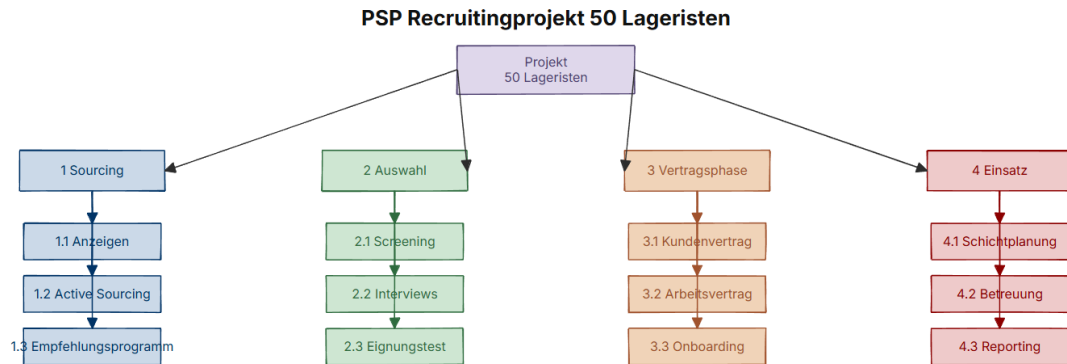

Hinweis: Die hierarchische Darstellung erfolgt typischerweise als Baumdiagramm oder als Balkenstruktur. Die Form entscheidet sich nach Lesbarkeit – bei groSSen PSPs eignet sich eher die Listendarstellung.

7.4 Plausibilitätscheck

- **Vollständigkeit:** Sind alle Funktionen abgedeckt?
- **100- %-Regel:** Decken die Teilaufgaben jeweils ihre Hauptphase vollständig ab?
- **Überschneidungsfreiheit:** Kommt keine Aufgabe doppelt vor?
- **Verantwortung:** Hat jedes AP genau eine/n Verantwortliche/n? – noch zu klären in der RACI-Matrix
- **Aufwand:** Liegen alle APs zwischen 8 und 80 Stunden? – Detaillierung in der AP-Karte

8 Vom Projektstrukturplan zum Ablaufplan und Kostenplan

Der Projektstrukturplan ist die Grundlage für die nachgelagerten Planungsschritte:

1. **Ablaufplan / Gantt-Diagramm** (Tag 09): Reihenfolge und Abhängigkeiten der APs werden definiert.
2. **Ressourcenplan** (Tag 09): Personal, Budget, Sachmittel werden auf APs verteilt.
3. **Risikoanalyse**: Pro AP werden Risiken bewertet.
4. **Reporting**: Soll-Ist-Vergleich je AP (Tag 10).

Reihenfolge wichtig!

Erst der Projektstrukturplan, dann der Ablaufplan. Wer gleich mit dem Gantt-Diagramm beginnt, vergisst typischerweise Aufgaben oder definiert sie unscharf. Der Projektstrukturplan zwingt zur Vollständigkeit.

9 Software-Werkzeuge zur PSP-Erstellung

In der Praxis werden zur PSP-Erstellung verschiedene Werkzeuge eingesetzt:

Werkzeug	Stärken	Einsatzbereich
MS Project	Vollständige PM-Suite, gute Ablaufplanung	Mittlere bis große Projekte
MindManager / XMind	Visuelle Baumstruktur, intuitive Bedienung	Brainstorming, frühe PSP-Phase
Excel / Google Sheets	Einfach, weit verbreitet, flexibel	Kleine bis mittlere Projekte
Jira / Trello	Agil, Kanban-orientiert	IT-Projekte, agile Teams
MeisterTask, Asana, Monday	Web-basiert, Kollaboration	Verteilte Teams

Empfehlung für Personaldienstleistungsunternehmen: Bei Großkundenprojekten reicht oft Excel oder MeisterTask. Für komplexere Projekte (Niederlassungseröffnung) lohnt MS Project.

10 Glossar

Begriff	Definition
Projektstrukturplan	Hierarchische Darstellung aller Elemente eines Projekts.
WBS	Work Breakdown Structure – englisch für Projektstrukturplan.
Arbeitspaket (AP)	Kleinste eigenständige Planungseinheit im Projektstrukturplan, 8–80 Stunden Aufwand.
AP-Karte / Steckbrief	Detaillierte Beschreibung eines APs (Verantwortung, Aufwand, Termin etc.).
Liefer-Ergebnis (Deliverable)	Konkretes Ergebnis eines APs.
Ebene	Hierarchiestufe im Projektstrukturplan (0 = Projekt, 1 = Teilprojekt, 2 = Teilaufgabe, 3 = AP).
100- %-Regel	Untergeordnete Elemente müssen 100 % der übergeordneten Aufgabe abdecken.
8/80-Regel	APs sollten zwischen 8 und 80 Stunden Aufwand haben.
Objektorientierter Projektstrukturplan	Gliederung nach Liefergegenständen.
Funktionsorientierter Projektstrukturplan	Gliederung nach Funktionen / Tätigkeitsarten.
Gemischter Projektstrukturplan	Kombination aus Objekten und Funktionen.
Top-Down	Vorgehen vom Projektziel zu Details (Ebene 0 → AP).
Bottom-Up	Vorgehen von Einzelaufgaben zur Gesamtstruktur (AP → Ebene 0).
DIN 69901	Deutsche PM-Norm (Definitionen, Prozesse, Begriffe).
Bewerbermanagementsystem	Applicant Tracking System – Bewerbermanagementsystem.
PSA	Persönliche Schutzausrüstung.
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.

TV-GVP

Tarifvertrag iGZ-DGB / GVP-DGB
für Zeitarbeit.

AÜG

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

11 Übungsaufgaben

1. Definieren Sie den Begriff Projektstrukturplan und nennen Sie drei seiner Hauptfunktionen.
2. Erläutern Sie die 100- %-Regel anhand eines Beispiels aus der PDL-Branche.
3. Vergleichen Sie objektorientierten und funktionsorientierten Projektstrukturplan. Welche Form passt besser für ein Recruiting-Projekt? Begründen Sie.
4. Erstellen Sie eine vollständige AP-Karte für das Arbeitspaket “2.2 Vorstellungsgespräche vor Ort” aus dem Beispielprojekt.
5. Erläutern Sie die 8/80-Regel und nennen Sie drei Konsequenzen, wenn APs zu groSS werden.
6. Skizzieren Sie einen Projektstrukturplan für das Projekt “Eröffnung neuer Niederlassung Hamburg” (Ebene 1 + 2 reicht).

12 Zusammenfassung

Take-aways Tag 08

- **Der Projektstrukturplan** ist die hierarchische Darstellung aller Projektaufgaben (DIN 69901-2).
- **Drei Gliederungsprinzipien:** objektorientiert, funktionsorientiert, gemischt.
- **Das Arbeitspaket** ist die kleinste Planungseinheit (8–80 h, eine/n Verantwortliche/n, klares Ergebnis).
- **AP-Karte** dokumentiert Verantwortung, Aufwand, Liefer-Ergebnis, Abnahmekriterien.
- **100- %-Regel:** alle Aufgaben müssen vollständig erfasst sein.
- **Reihenfolge:** erst Projektstrukturplan, dann Ablaufplan und Kostenplan.
- **Im PDL-GroSSkundenprojekt** bewährt sich ein funktionsorientierter Projektstrukturplan mit den Phasen Akquise, Auswahl, Einstellung, Onboarding, Einsatzsteuerung.

Literaturverzeichnis

- Burghardt, M. (2018). *Projektmanagement: Leitfaden für die Planung, Überwachung und Steuerung von Projekten* (10. Aufl.). Publicis MCD.
- DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901 – Projektmanagement – Projektmanagementsysteme*. Beuth Verlag. Berlin.
- Kuster, J., Bachmann, C., Hubmann, M., Lippmann, R., & Schneider, P. (2022). *Handbuch Projektmanagement: Agil – Klassisch – Hybrid* (5. Aufl.). Springer Gabler.
- Patzak, G., & Rattay, G. (2014). *Projektmanagement: Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen* (6. Aufl.). Linde Verlag.
- Schelle, H., Ottmann, R., & Pfeiffer, A. (2018). *Projektmanager* (5. Aufl.). GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement.
