

Projektstrukturplan

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer –
Personaldienstleistungskaufmann/-frau – Tag 08

Can Siebert

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

13. Mai 2026 – Stand 05/2026

- 1 Einführung
- 2 Begriff und Funktion
- 3 Hierarchie und Aufbau
- 4 Drei Gliederungsprinzipien
- 5 Arbeitspakete & AP-Karte
- 6 Vorgehen zur PSP-Erstellung
- 7 PDL-Praxisbeispiel
- 8 Vom Projektstrukturplan zu den Folgeplänen
- 9 Zusammenfassung

Sie können nach diesem Tag...

- den Begriff Projektstrukturplan und seine Funktionen erklären,
- die drei Gliederungsprinzipien unterscheiden,
- einen Projektstrukturplan in mehreren Ebenen aufbauen,
- Arbeitspakete (AP) definieren und mit AP-Karte dokumentieren,
- einen Projektstrukturplan für ein PDL-Großkundenprojekt entwerfen.

Lerninhalt aus dem Rahmenlehrplan

P10: Projektstrukturierung

Warum ein Projektstrukturplan?

PM-Spruchwort

“Was nicht im Projektstrukturplan steht, wird im Projekt nicht gemacht.”

- Zentrales Planungsinstrument im PM (DIN Deutsches Institut für Normung, 2009)
- Grundlage für: Ablaufplan, Kostenplan, Risikoanalyse, Reporting
- Zwingt zur **vollständigen** Erfassung aller Aufgaben
- Zerlegt das Projekt in handhabbare **Arbeitspakete**

Projektstrukturplan

“Vollständige hierarchische Darstellung aller Elemente (Teilprojekte, Teilaufgaben, Arbeitspakete) eines Projekts in Strukturform mit ihren projektspezifischen Beziehungen.”

Vier Merkmale

Vollständigkeit – Eindeutigkeit – Hierarchie – Projektbezug

Funktionen des Projektstrukturplan

- ➊ Strukturierung – Zerlegung in Einheiten
- ➋ Verantwortungszuordnung – 1 Verantwortliche/r pro AP
- ➌ Aufwandsschätzung – Zeit, Kosten je AP
- ➍ Ablaufplanung – Vorgangsdefinition (Tag 09)
- ➎ Reporting-Basis – Soll-Ist-Vergleich je AP
- ➏ Kommunikationswerkzeug – gemeinsames Bild

Was der Projektstrukturplan NICHT enthält

Keine zeitliche Reihenfolge, keine Termine – das macht später der Ablaufplan!

Ebene	Bezeichnung	Beispiel
0	Gesamtprojekt	0
1	Teilprojekt / Hauptphase	1, 2, 3
2	Teilaufgabe / Modul	1.1, 1.2
3	Arbeitspaket (AP)	1.1.1, 1.1.2
4	Tätigkeit (optional)	1.1.1.1

Empfohlene Tiefe

3–5 Ebenen, je nach Projektgröße

Drei wichtige Regeln

- **8/80-Regel:** AP zwischen 8 h (1 Tag) und 80 h (2 Wochen)
- **Reporting-Periode-Regel:** $AP \leq 2$ Reporting-Perioden
- **Ein-Verantwortlicher-Regel:** genau 1 Person pro AP

100- %-Regel

Die Summe aller untergeordneten Elemente einer Ebene muss 100 % der übergeordneten Aufgabe abdecken.

Welches Prinzip wann?

- 1 **Objektorientiert** – nach Liefergegenständen
- 2 **Funktionsorientiert** – nach Tätigkeitsarten / Funktionen
- 3 **Gemischt** – Kombination aus beiden

Objektorientierter Projektstrukturplan

Hausbau-Beispiel

1. Keller – 2. Erdgeschoss – 3. Obergeschoss – 4. Dach

Geeignet für

Bauprojekte, Produktentwicklung, Software-Module

PDL-Bewertung

Recruiting-Projekte: meist wenig sinnvoll, da Funktionen sich wiederholen

Funktionsorientierter Projektstrukturplan

Hausbau-Beispiel

1. Planung – 2. Genehmigung – 3. Rohbau – 4. Innenausbau – 5. Übergabe

PDL-Beispiel

1. Akquise – 2. Auswahl – 3. Einstellung – 4. Onboarding – 5. Steuerung

Geeignet für

Recruiting-Projekte, Veranstaltungsplanung, Beratung

Gemischter Projektstrukturplan (Phasen + Objekte)

Aufbau

Ebene 1 nach Phasen, Ebene 2 nach Objekten (oder umgekehrt)

PDL-Beispiel

Ebene 1: Akquise / Auswahl / Einstellung

Ebene 2 unter Akquise: Active Sourcing / Stellenbörsen / Empfehlungen

Praxis-Empfehlung

Häufig die beste Lösung – flexibel und praxisnah

Vergleichstabelle

Prinzip	Vorteile	Nachteile
Objektorientiert	Klare Liefer-Objekte	Funktions-Doppelarbeit
Funktionsorientiert	Klare Aufgabenzuordnung	Liefer-Objekte spät sichtbar
Gemischt	Flexibel, praxisnah	Komplexer in der Erstellung

Definition

“In sich geschlossene Aufgabenstellung innerhalb eines Projekts, die bis zu einem festgelegten Zeitpunkt mit definiertem Ergebnis und Aufwand vollbracht werden kann.”

Eigenschaften

- Eigenständig, abgrenzbar
- 8–80 Stunden Aufwand
- Klares Liefer-Ergebnis (Deliverable)
- Eine/n Verantwortliche/n

Bestandteile einer AP-Karte

Feld	Beschreibung
AP-Nummer	1.1, 2.3.1 etc.
Bezeichnung	Kurztitel
Verantwortliche/r	1 Person
Beschreibung	Was ist konkret zu tun?
Liefer-Ergebnis	Was kommt am Ende raus?
Voraussetzungen	Was muss vorher fertig sein?
Aufwand	PT / Stunden
Kosten	€
Termin	Start / Ende geplant
Abnahmekriterien	Wann gilt es als "fertig"?
Risiken	Bekannte Risiken / Annahmen

Beispiel AP-Karte “Active Sourcing”

- AP 1.1 – Active Sourcing über LinkedIn / XING / Indeed
- Verantwortlich: Recruiter:in A (Frau Müller)
- Beschreibung: Direktansprache 200 potenzieller Lageristen
- Liefer-Ergebnis: 30 qualifizierte Bewerber:innen im Bewerbermanagementsystem
- Voraussetzungen: Anforderungsprofil freigegeben
- Aufwand: 40 PT, Kosten: 6.400 € + 1.200 € (Account)
- Termin: KW 20–22
- Abnahmekriterien: ≥ 30 Bewerber, davon 15 vollständig
- Risiken: Sommerurlaub, Konkurrenz

Häufige Fehler

- Zu groß (>80 h) oder zu klein (<8 h)
- Mehrere Verantwortliche
- Unklares Ergebnis (“Recruiting machen”)
- Keine Abnahmekriterien
- Tagesgeschäft im Projektstrukturplan (z. B. “E-Mails beantworten”)

- ➊ Projektziel klären (Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert, aus Tag 06)
- ➋ Hauptphasen / Hauptliefergegenstände identifizieren
- ➌ Teilaufgaben pro Hauptphase ableiten
- ➍ Arbeitspakete definieren
- ➎ Vollständigkeit prüfen (100 %)
- ➏ Verantwortliche zuordnen
- ➐ AP-Karten ausarbeiten
- ➑ Mit Team und Lenkungsausschuss abstimmen

Alternative: Bottom-Up

Vorgehen

- Team sammelt alle Aufgaben (Brainstorming, Post-its)
- Gruppierung zu Teilaufgaben und Hauptphasen

Vorteil

Erfahrungen des Teams fließen ein

Nachteil

Gefahr von Lücken und Überschneidungen

Praxis: Mischverfahren

PL gibt Struktur Top-Down vor, Team ergänzt Bottom-Up im Workshop

Ebene 1 – Hauptphasen

- ① Akquise / Bewerbergewinnung
- ② Auswahl / Eignungsprüfung
- ③ Einstellung / Vertragsmanagement
- ④ Onboarding / Einsatzvorbereitung
- ⑤ Einsatzsteuerung / Onsite-Betrieb

- 1.1 Active Sourcing (LinkedIn, XING, Indeed)
- 1.2 Stellenanzeigen (Stepstone, Indeed, eigene Website)
- 1.3 Empfehlungsprogramm intern + extern
- 1.4 Kooperation Bundesagentur für Arbeit

Auswahl (2.x)

- 2.1 Telefon-Screening
- 2.2 Vorstellungsgespräche
- 2.3 Eignungstests
- 2.4 Referenzprüfungen
- 2.5 Kandidaten-Konferenz

Einstellung (3.x)

- 3.1 Arbeitsvertrag (TV-GVP)
- 3.2 Personalakte (DSGVO)
- 3.3 SV-Anmeldung
- 3.4 ANÜ-Vertrag (AÜG)


Onboarding (4.x)

- 4.1 Sicherheitsunterweisung (DGUV)
- 4.2 Arbeitskleidung / PSA
- 4.3 Einweisung Einsatzort
- 4.4 Schichtplan KW 1–4

Einsatzsteuerung (5.x)

- 5.1 Tägliche Disposition
- 5.2 Wöchentliches Kunden-Statusmeeting
- 5.3 Stundenerfassung / Lohn
- 5.4 Mitarbeiter-Feedback nach 4 Wochen

PSP Recruitingprojekt 50 Lageristen

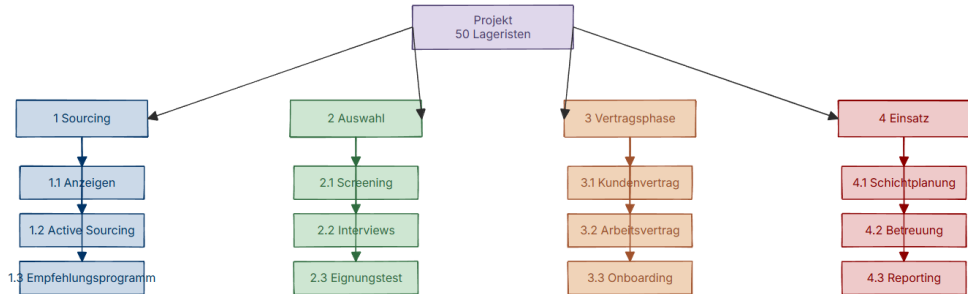

Checkliste

- Vollständigkeit: alle Funktionen abgedeckt? ✓
- 100- %-Regel: decken Teilaufgaben ihre Hauptphase ab? ✓
- Überschneidungsfreiheit: kein Doppelaufschlag? ✓
- Verantwortung: 1 Person pro AP – nächster Schritt: RACI
- Aufwand: 8/80-Regel je AP eingehalten? Detail-AP-Karten

Was kommt nach dem Projektstrukturplan?

- ➊ **Ablaufplan / Gantt** – Reihenfolge & Abhängigkeiten (Tag 09)
- ➋ **Ressourcenplan** – Personal, Budget, Sachmittel (Tag 09)
- ➌ **Risikoanalyse** – pro AP
- ➍ **Reporting** – Soll-Ist je AP (Tag 10)

Reihenfolge wichtig!

Erst Projektstrukturplan, dann Gantt – wer mit Gantt beginnt, vergisst Aufgaben.

Werkzeug	Stärken	Einsatz
MS Project	Vollständige PM-Suite	Mittel–groß
XMind / MindManager	Visuelle Bäume	Brainstorming
Excel / Sheets	Einfach, flexibel	Klein–mittel
Jira / Trello	Agil, Kanban	IT, agile Teams
Asana, Monday	Kollaboration	Verteilte Teams

PDL-Empfehlung

Großkundenprojekt: Excel oder MeisterTask. Niederlassungseröffnung: MS Project.

7 Kernbotschaften

- ➊ Projektstrukturplan = hierarchische Darstellung aller Projektaufgaben
- ➋ 3 Prinzipien: objekt-, funktions-, gemischt
- ➌ AP = kleinste Einheit (8–80 h, 1 Verantwortliche/r)
- ➍ AP-Karte dokumentiert Verantwortung, Aufwand, Liefer-Ergebnis
- ➎ 100- %-Regel = Vollständigkeit
- ➏ Reihenfolge: Projektstrukturplan → Ablaufplan → Kostenplan
- ➐ Personaldienstleistungsunternehmen: funktionsorientiert (Akquise, Auswahl, Einstellung, Onboarding, Steuerung)

Übermorgen: Ablaufplanung & Ressourcenplanung

- Reihenfolge der APs (Vorgangs-Beziehungen)
- Gantt-Diagramm und Netzplantechnik (CPM)
- Personal-, Budget-, Zeit- und Sach-Ressourcen

DIN Deutsches Institut für Normung. (2009). *DIN 69901 – Projektmanagement – Projektmanagementsysteme*. Beuth Verlag. Berlin.

Vielen Dank!

Fragen & Diskussion

© 2026 Can Siebert
