

Projektstrukturplan

Presenter-Version mit Notizen

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer – Tag 08

Can Siebert

© 2026 Can Siebert

13. Mai 2026

Begrüßung. Rückblick Tag 07: Rollen + Projektorganisation. Heute: Wie strukturieren wir die Arbeit selbst? Der Projektstrukturplan ist DAS Schlüsselwerkzeug im PM. Ankündigung: Heute viel Praxisarbeit am Beispielprojekt "50 Lageristen".

PSP-Begriff, 3 Gliederungsprinzipien, AP definieren, AP-Karte, PDL-Beispiel

Lernziele explizit machen. Am Ende des Tages soll jede:r TN selbst einen kleinen Projektstrukturplan entwerfen können. Hinweis: Wer in der IHK-Prüfung scheitert, scheitert oft am Projektstrukturplan – daher heute besonders aufmerksam!

Warum Projektstrukturplan?

“Was nicht im Projektstrukturplan steht, wird nicht gemacht.”
Grundlage für: Ablauf, Kosten, Risiko, Reporting.

Anekdote erzählen: Ein PDL-Projekt wurde gestartet ohne Projektstrukturplan, nur mit “Wir machen mal”. Nach 4 Wochen war klar: keiner wusste, wer DSGVO-Erklärungen einholt. Resultat: 30 Bewerber, aber 10 nicht eingestellt werden konnten. Lehre: Projektstrukturplan nicht aus Bürokratie, sondern als Realitäts-Check.

Vollständige hierarchische Darstellung aller Elemente eines Projekts.

DIN 69901 ist die deutsche Projektmanagement-Norm. Wichtige Begriffe: "vollständig" (100 %-Regel kommt gleich) und "hierarchisch" (Baum-Struktur). Diese Definition kann in der IHK-Klausur verlangt werden.

Funktionen des Projektstrukturplan

Strukturierung – Verantwortung – Aufwand – Ablauf – Reporting – Kommunikation

Sechs Funktionen alle wichtig. Besonders betonen: Reporting-Basis. Ohne Projektstrukturplan kein klares Reporting möglich. Den TN klar machen: Soll-Ist-Vergleich kann nur stattfinden, wenn man weiß, was geplant war – und das steht im Projektstrukturplan.

Ebene	Bezeichnung	Beispiel
0	Projekt	0
1	Teilprojekt	1
2	Teilaufgabe	1.1
3	AP	1.1.1

Nummerierung wichtig für Klausur. Kombination aus Hierarchie und Codierung: An der Nummer sieht man die Position. Beispiel: 2.3.1 = Teilprojekt 2, Teilaufgabe 3, AP 1. Frage: Wie tief sollte man gliedern? Faustregel: 3-5 Ebenen. Mehr wird unübersichtlich.

8/80-Regel; Reporting-Periode-Regel; 1 Verantwortliche/r; 100- %-Regel.

Diese vier Regeln sind das Handwerkszeug. Insbesondere die 8/80-Regel: APs unter 8h sind Mikromanagement, APs über 80h sind nicht mehr steuerbar. 100 %-Regel mit Beispiel erklären: Wenn unsere Akquise aus 1.1, 1.2 und 1.3 besteht, müssen diese drei zusammen alles abdecken – nichts darf vergessen werden.

Drei Gliederungsprinzipien

Objektorientiert – Funktionsorientiert – Gemischt

Diese drei Prinzipien sind klausurrelevant. Schnell merken: Objekte = WAS gebaut wird (Hausbau: Keller-EG-OG). Funktionen = WIE gearbeitet wird (Hausbau: Planung-Bau-Übergabe). Praxis: meist gemischt.

Hausbau: Keller, EG, OG, Dach.
PDL-Recruiting: meist nicht sinnvoll.

Wichtig: Nicht jedes Prinzip passt für jedes Projekt. Beim Recruiting hätten wir Schicht 1 / Schicht 2 als “Objekte”
– aber die Funktionen Akquise/Auswahl/Einstellung wiederholen sich für jede Schicht. Resultat: Doppelarbeit im Projektstrukturplan. Daher meist Funktionsorientierung.

Personaldienstleistungsunternehmen: Akquise – Auswahl – Einstellung – Onboarding – Steuerung

Diese fünf Phasen sind der ROTE FADEN für unser PDL-Beispielprojekt. Wer diese fünf Phasen versteht, hat das Recruiting-Projekt verstanden. Verweis auf Tag 06 (Stakeholder), Tag 07 (Rollen), Tag 09 (Ablauf): Alles bezieht sich auf diese fünf Phasen.

Praxis: meist beste Lösung. Phasen + Quellen / Module.

In der echten Praxis ist es selten rein eins oder anders. Beispiel: Wir gliedern Phasen funktional, innerhalb Akquise dann objektorientiert nach Quellen (LinkedIn, Stepstone, Empfehlung). Das macht den Projektstrukturplan gut handhabbar.

Vergleichstabelle

Prinzip	Vorteile	Nachteile
Objekt	klare Liefer-Objekte	Funktions-Doppelung
Funktion	klare Aufgabenzuordnung	Liefer-Objekte spät
Gemischt	flexibel	komplex

Tabelle in den Mitschrieb übernehmen lassen. Diese drei Zeilen können in der Klausur abgefragt werden. Mnemotechnik: "Objekt = Was", "Funktion = Wie", "Gemischt = Was + Wie".

In sich geschlossen, definiertes Ergebnis und Aufwand.

Definition wörtlich lernen lassen. "In sich geschlossen" bedeutet: das AP kann eigenständig bearbeitet und abgeschlossen werden. "Definiertes Ergebnis" bedeutet: am Ende kommt etwas Konkretes raus, das man messen kann.

Nr – Bezeichnung – Verantwortlich – Beschreibung – Liefer-Ergebnis – Voraussetzungen – Aufwand – Kosten – Termin – Abnahme – Risiken

11 Felder. Im Comcave-Online-Material finden die TN eine Word-Vorlage zum Download. Hinweis: Nicht jedes AP braucht alle 11 Felder ausgefüllt – aber Nr, Verantwortlich, Liefer-Ergebnis und Aufwand sind Pflicht.

Beispiel AP 1.1 Active Sourcing

Verantwortlich: Recruiter:in. 30 Bewerber:innen im Bewerbermanagementsystem. 40 PT, 6.400 €.

Konkret durchgehen. Alle Felder benennen. Wichtig: Liefer-Ergebnis ist NICHT “LinkedIn ansprechen” – das ist die Tätigkeit. Liefer-Ergebnis ist “30 qualifizierte Bewerber:innen im Bewerbermanagementsystem” – das ist messbar. Im Quiz wird dieser Unterschied geprüft.

Zu groSS/klein – mehrere Verantwortliche – unklares Ergebnis – keine Abnahme – Tagesgeschäft

Diese fünf Fehler sind die häufigsten in der Praxis. "Tagesgeschäft im Projektstrukturplan" wichtig: E-Mails beantworten, Kaffee kochen – gehört nicht ins Projekt-AP. Nur projektrelevante Aufgaben.

Ziel → Phasen → Teilaufgaben → APs

Top-Down ist die Standard-Methode. Wir beginnen beim Projektziel (Tag 06: Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert) und arbeiten uns nach unten. Disziplin: Erst Ebene 1 vollständig, dann Ebene 2 etc. Sonst Gefahr, sich in Details zu verlieren.

Bottom-Up: Brainstorming. Mischverfahren: Top-Down + Workshop.

Bottom-Up als Ergänzung. Brainstorming-Workshop mit Post-its an der Wand. Vorteil: Erfahrungswissen wird genutzt. Nachteil: Lücken möglich. Daher Mischverfahren in der Praxis: PL gibt Struktur vor, Team füllt Inhalte.

Beispiel: Ebene 1

1 Akquise, 2 Auswahl, 3 Einstellung, 4 Onboarding, 5 Steuerung

Diese Ebene 1 ist Pflicht-Wissen für die Klausur. TN auffordern, diese fünf Phasen ins Heft zu schreiben. Rückbezug zu Tag 04 (Projektarten) und Tag 06 (Ziele).

1.1 Active Sourcing, 1.2 Stellenanzeigen, 1.3 Empfehlung, 1.4 Bundesagentur für Arbeit

Vier Akquise-Kanäle. Frage an TN: Welcher Kanal bringt welche Zielgruppe? Active Sourcing für qualifizierte/seltene Profile, Stellenanzeigen für Massengeschäft, Empfehlung für Schnelle, Bundesagentur für Arbeit für Unterstützung. Realistische Verteilung beim Lageristen: ca. 40 % Bundesagentur für Arbeit, 30 % Stellenbörsen, 20 % Empfehlung, 10 % Active Sourcing.

Auswahl: Screening-Gespräch-Test-Referenz-Konferenz. Einstellung: Vertrag-Akte-SV-ANÜ.

Hier kommt die rechtliche Komponente ins Spiel. Arbeitsvertrag nach TV-GVP (Tag 11/12 vertieft). DSGVO bei Personalakte. SV-Anmeldung pflicht. ANÜ-Vertrag = Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit Kundenbetrieb – gem. AÜG.

DGUV, PSA, Schichtplan, Disposition, Stunden, Feedback

Onboarding ist der unterschätzte Erfolgsfaktor. Wer am Tag 1 gut ankommt, bleibt länger. Schichtplan KW 1-4 muss VOR Einsatzstart fertig sein – sonst Chaos. Stundenerfassung tagesaktuell für Lohnabrechnung.

PSP Recruitingprojekt 50 Lageristen

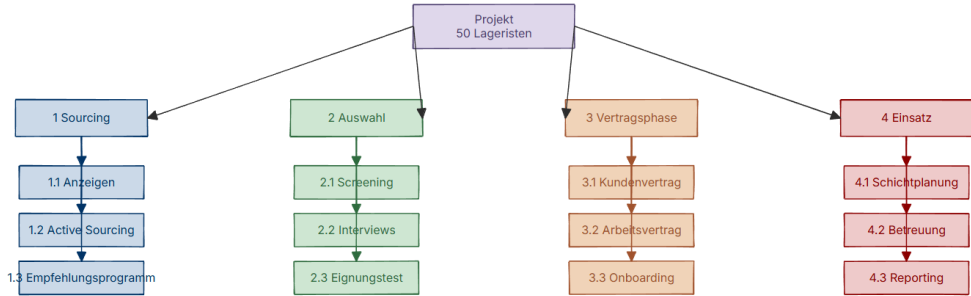


Diagramm gemeinsam betrachten. Baumstruktur von oben nach unten. Wer keinen PowerPoint zur Hand hat:
Excel-Listendarstellung tut es auch. Hauptsache: vollständig.

Vollständigkeit, 100 %, keine Doppelung, 1 Verantwortliche/r, 8/80

Diese fünf Checks am Ende jeder PSP-Erstellung machen. “Plausibilitätscheck” ist ein Begriff, der in der Klausur vorkommen kann. Wichtig: Nicht alleine machen, sondern im Team prüfen – “Vier-Augen-Prinzip”.

Was kommt nach dem Projektstrukturplan?

Ablaufplan – Ressourcenplan – Risiko – Reporting

Der Projektstrukturplan ist nur der erste Schritt. Morgen Tag 09: Ablaufplan und Ressourcen. Tag 10: Soll-Ist-Vergleich. Tag 11: Projektabschluss + Doku. Heute: Fundament legen.

MS Project, XMind, Excel, Jira, Asana

Tooling-Tipps. PDL-Praxis: oft Excel oder MeisterTask. MS Project ist mächtig, aber teuer (Lizenz). Online-Tools (Asana, Monday) gut für verteilte Teams. Trello/Jira eher für IT/agile Projekte.

Projektstrukturplan, 3 Prinzipien, AP, AP-Karte, 100 %, Reihenfolge, PDL-funktional

Sieben Punkte zusammenfassen. TN auffordern, diese als “Spickzettel” für die Klausur ins Heft zu übernehmen.
Hinweis auf [QuizTag08.html](#) zur Selbstberprfung – –60Fragen.

Ablaufplanung, Gantt, Netzplan, Ressourcen

Brücke zu Tag 09. Heute Was, morgen Wann und Wer. Ohne Projektstrukturplan kein Gantt. Daher heute solide arbeiten.

Quellenhinweise. Patzak/Rattay = DACH-Klassiker. Burghardt = sehr praxisnah. Schelle/Ottmann (GPM) = deutsche Standard-PM-Literatur.

Vielen Dank!

Fragen & Diskussion

Abschluss. Hausaufgabe: Jede:r TN entwirft einen kleinen 2-Ebenen-PSP für ein selbst gewähltes "Projekt" aus dem eigenen Ausbildungsbetrieb. Vorstellung morgen früh.
